

**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ
Ε.Π. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ»
2007-2013**

**ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013**

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.....	2
1.1 Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος.....	2
1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο	16
1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους....	16
1.4 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα	19
1.5 Ρυθμίσεις παρακολούθησης.....	20
1.5.1 Κανονιστικά θέματα.....	20
1.5.2 1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης	22
1.5.3 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ	25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	27
3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»	27
3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	27
3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	30
3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»	30
3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	30
3.2.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	32
3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»	32
3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	32
3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	35
3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»	35
3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	35

3.4.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	41
3.5	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»	41
3.5.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	41
3.5.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους.....	46
3.6	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»	46
3.6.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	46
3.6.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	49
3.7	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»	49
3.7.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	49
3.7.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	54
3.8	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».....	54
3.8.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	54
3.8.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	56
3.9	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»	56
3.9.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου	56
3.9.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	58
3.10	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας»	58
3.10.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου.....	58
3.10.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	60
3.11	Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10.2 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»	60

3.11.1	Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου.....	60
3.11.2	Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους.....	60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 61		
4.1	Έργα - Γέφυρες	61
4.2	Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία (Άρθρο 16/1083/2006.....	61
4.3	Τεχνική Βοήθεια	63
4.4	Πληροφόρηση και Δημοσιότητα.....	64

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: COCOF 09/0008/02-EN Annex I- ΜΑΘΡΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	Σχετικός στόχος: Στόχος «Σύγκλιση»
	Σχετική επιλέξιμη περιοχή : Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (GR 11), Κεντρικής Μακεδονίας (GR 12) και Δυτικής Μακεδονίας (GR 13)
	Περίοδος προγραμματισμού : 2007-2013
	Αριθμός προγράμματος (αριθ. CCI) : CCI 2007GR161PO008
	Τίτλος προγράμματος : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	Έτος υποβολής στοιχείων : 2008
	Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την επιτροπή παρακολούθησης

Η παρούσα έκθεση αποτελεί τη δεύτερη ετήσια έκθεση εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, σύμφωνα με το Άρθρο 67 του Καν. (ΕΚ) 1083/06 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) 1260/1999».

Η έκθεση συντάχθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.), σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧVΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης», καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ' αριθ. πρωτ. 23288/ΕΥΣΣΑΑΠ/1332/23-5-08 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.1 Ολοκλήρωση και ανάλυση της προόδου Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Ως δεύτερο έτος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το 2008 ήταν έτος αφενός ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εξειδίκευσης και αφετέρου ενεργοποίησης του Προγράμματος. Κατά το έτος αναφοράς, πραγματοποιήθηκε η εκχώρηση στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές (ΕΔΑ) και στους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) προϋπολογισμών για δράσεις που αφορούσαν τους δέκα Άξονες Προτεραιότητας. Επιπλέον, προωθήθηκε η δημοσιοποίηση προκηρύξεων και ένας αριθμός εντάξεων στο Ε.Π. (χωρίς ωστόσο να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των αντίστοιχων έργων), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αποτύπωση και παρουσίαση στοιχείων προόδου φυσικού αντικείμενου για τους Άξονες Προτεραιότητας και το Ε.Π. συνολικά.

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί, ότι οι τιμές αφετηρίας στους πίνακες δεικτών οι οποίοι ακολουθούν, προέρχονται από τα στοιχεία και τις σχετικές αναφορές που έχουν αναλυτικά παρουσιασθεί στο Ε.Π.

1.1.1 Φυσική πρόοδος του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η παρουσίαση της φυσικής προόδου του Προγράμματος συνδέεται με τους στόχους του και τις κατηγορίες πράξεων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες προετοιμασίας της έναρξης της εφαρμογής του Προγράμματος.

Στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι *η δημιουργία μιας βιώσιμης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή.*

Ο στόχος αυτός επιμερίζεται σε τρεις γενικούς στόχους, οι οποίοι είναι:

- Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος στη Χωρική Ενότητα Μακεδονίας – Θράκης, μέσω της αξιοποίησης των πολλαπλών δυνατοτήτων, που παρέχει η μετάβαση στην οικονομία της γνώσης.
- Η αξιοποίηση της θέσης της Χωρικής Ενότητας στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικότερα των Βαλκανίων, καθώς και της εγγύτητας στις αναδυόμενες αγορές της Μαύρης Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της ολοκλήρωσης των διευρωπαϊκών και περιφερειακών δικτύων, της

ενίσχυσης των διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών και της προώθησης των επιχειρηματικών δικτυώσεων και εξωστρέφειας.

- Η ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της αειφορίας, για τη μείωση των ανισοτήτων και τη μεγαλύτερη συμμετοχή όλων στα αποτελέσματα της ανάπτυξης.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπως προσδιορίζεται και από τον τίτλο του, έχει πεδίο εφαρμογής στη Χωρική Ενότητα Μακεδονία – Θράκη, η οποία περιλαμβάνει δύο μεταβατικές διοικητικές Περιφέρειες που ανήκουν στο στόχο «σύγκλιση» – phasing out (Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) και μία Περιφέρεια αμιγούς στόχου «σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη).

Η αναλυτική παρουσίαση της Υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας γίνεται στο Κεφάλαιο 3 της Παρούσας Έκθεσης.

Συγκεντρωτικά, το έτος 2008, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης εξειδικεύθηκαν οι παρακάτω Θεματικές Προτεραιότητες:

- 03 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ), ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛΩΝ (επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.),
- 04 : ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε&ΤΑ, ΙΔΙΩΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών κέντρων),
- 05 : ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
- 06 : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)
- 07 : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ

- ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε&ΤΑ Κ.ΛΠ.)
- 08 : ΆΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 - 09 : ΆΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ,
 - 20 : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ,
 - 22 : ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
 - 23 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
 - 33 : ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ,
 - 34 : ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (ΔΕΔ -Η)
 - 35 : ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 - 36 : ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΔΕΔ -Η)
 - 39 : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 - 40 : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 - 57 : ΆΛΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 - 69 : ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 - 75 : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 - 81 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 - 85 : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
 - 86 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά το έτος αναφοράς δημοσιοποιήθηκε σημαντικός αριθμός προσκλήσεων και εκδόθηκαν αποφάσεις ένταξης για 3 έργα που αφορούσαν, τη Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 5 (2 έργα) και τη «Βοήθεια στο Σπίτι» στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 69 (1 έργο).

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, ανά διοικητική Περιφέρεια, οι θεματικοί δείκτες κορμού (core indicators), σε προγραμματικό επίπεδο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										581
	Αφετηρία	40									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	517									528
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										32
	Αφετηρία	155									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										760
	Αφετηρία	2218 [Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, (αρ.) + 8,5 [Νέες θέσεις εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης, (ισοδύναμα ανθρ/έτη 12μηνης διάρκειας)]									760
Επαγόμενες Επενδύσεις (€million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										275
	Αφετηρία	220									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										119
	Αφετηρία	0									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία	0									
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	72									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	51,68									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										54
	Αφετηρία	860,89									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρομικών γραμμών εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	0									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										250.000
	Αφετηρία	0									
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										56
	Αφετηρία	30									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας (MWh)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										345.757
	Αφετηρία										
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										54.544
	Αφετηρία										
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100.000
	Αφετηρία	64.700									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	82.520									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	0									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25
	Αφετηρία	234									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Πρόληψη Κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	6									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	1.876.558									
Τουρισμός											
Αριθμός έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										201
	Αφετηρία	159									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12
	Αφετηρία	65									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17.600
	Αφετηρία	17.250									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										55
	Αφετηρία	50									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	102									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	88									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										68
	Αφετηρία	12									
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										173
	Αφετηρία	500									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	80									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										249
	Αφετηρία	716									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										75
	Αφετηρία	75									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25
	Αφετηρία	84									
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										+4%
	Αφετηρία	110.000									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										12
	Αφετηρία	24									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	23									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										49
	Αφετηρία	195									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρομικών γραμμών εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	0									
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	60									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10.000
	Αφετηρία	0									
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										18
	Αφετηρία	0									
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας (MWh)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										89.264
	Αφετηρία	0									
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωταγόνους ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17.758
	Αφετηρία	0									
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20.000
	Αφετηρία	80.000									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17.000
	Αφετηρία	20.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	1									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25
	Αφετηρία	1									
Πρόληψη Κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25
	Αφετηρία	0									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										300.000
	Αφετηρία	0									
Τουρισμός											
Αριθμός έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										365
	Αφετηρία	74									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	98									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										7.000
	Αφετηρία	15.000									
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	18									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	49									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	1									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούσες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία	4									

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Δείκτης		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη											
Αριθμός «έργων» έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Άμεση Ενίσχυση Επενδύσεων στις ΜΜΕ											
Αριθμός «έργων»	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										230
	Αφετηρία	710									
Εκ των οποίων: αριθμός ενάρξεων λειτουργίας που ενισχύθηκαν (πρώτα δύο χρόνια μετά την έναρξη)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	60									
Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται (μεικτές, ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1.000
	Αφετηρία	4.000									
Επαγόμενες Επενδύσεις (€million)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35Μ€
	Αφετηρία	120Μ€									
Κοινωνία της Πληροφορίας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Επιπρόσθετος πληθυσμός ο οποίος καλύπτεται από ευρυζωνικά	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Μεταφορές											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50
	Αφετηρία	75									
Κατασκευή και αποπεράτωση αυτοκινητοδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										39
	Αφετηρία	15									
Χιλιόμετρα κατασκευασμένων / αναβαθμισμένων δρόμων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										120
	Αφετηρία	180									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρομικών γραμμών εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Χιλιόμετρα αναβαθμισμένων σιδηροδρομικών γραμμών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	40									
Επιπρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από αναβαθμισμένα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Επιπρόσθετη δυναμικότητα για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας (MWh)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Ετήσια Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ



Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Περιβάλλον											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										70.000
	Αφετηρία	420.000									
Επιπρόσθετος ισοδύναμος πληθυσμός που εξυπηρετείται από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20.000
	Αφετηρία	300.000									
Αριθμός έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	0									
Αριθμός έργων αποκατάστασης περιοχών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										35
	Αφετηρία	30									
Πρόληψη Κινδύνων											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	30									
Αριθμός ατόμων που επωφελούνται από δασική αντιπυρική προστασία και άλλα μέτρα προστασίας δασών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										600.000
	Αφετηρία										
Τουρισμός											
Αριθμός έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										50
	Αφετηρία	90									
Εκπαίδευση											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	65									
Αριθμός ωφελούμενων μαθητών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										
	Αφετηρία										
Υγεία											
Αριθμός Έργων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	30									
Αστική Ανάπτυξη											
Φυσική και Περιβαλλοντική Αναγέννηση											
Αριθμός έργων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ελκυστικότητας των πόλεων	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										40
	Αφετηρία	50									
Ανταγωνιστικότητα											
Αριθμός έργων που αποσκοπεί στην προώθηση των επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα και νέων τεχνολογιών	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	20									
Κοινωνική Ενσωμάτωση											
Αριθμός έργων / υπηρεσιών για τη προώθηση των ίσων ευκαιριών και κοινωνικής ενσωμάτωσης για μειονεκτούντες ομάδες και νέους	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	30									

- Όσον αφορά στις πμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.
- Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες μετά την ένταξη ή / και εκτέλεση των αντίστοιχων έργων

1.1.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 ανέρχεται σε 4.478.669.300,00€, εκ των οποίων 4.176.000.000€ Συνολική Δημόσια Δαπάνη, στοχεύοντας να προσελκύσει άμεσα 302.669.300€ ιδιωτικών πόρων, ήτοι 7% του συνολικού κόστους του Προγράμματος. Η Κοινοτική Συνδρομή (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 2.675.000.000€. Πιο παραστατικά, τα προγραμματικά χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος, στο σύνολό του και ανά Άξονα Προτεραιότητας, παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα.

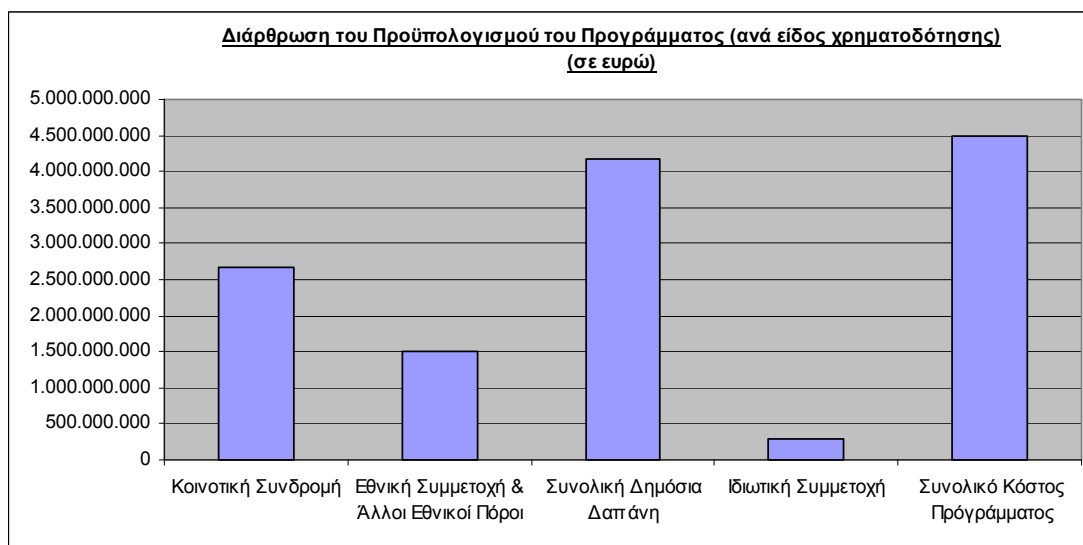

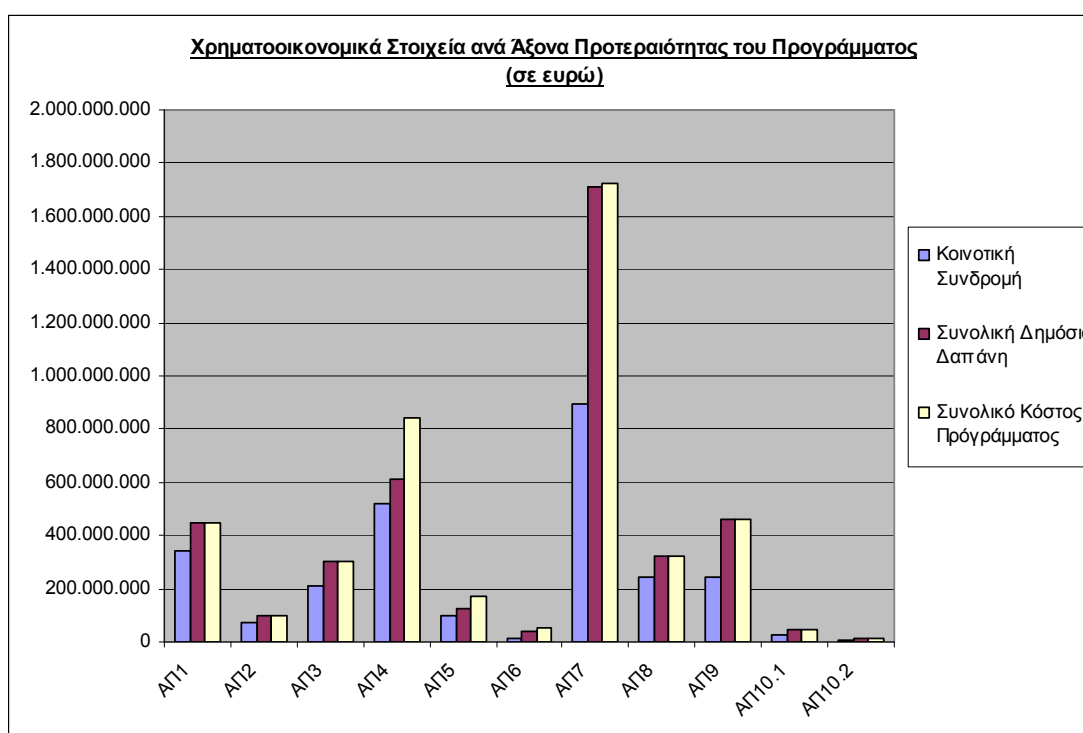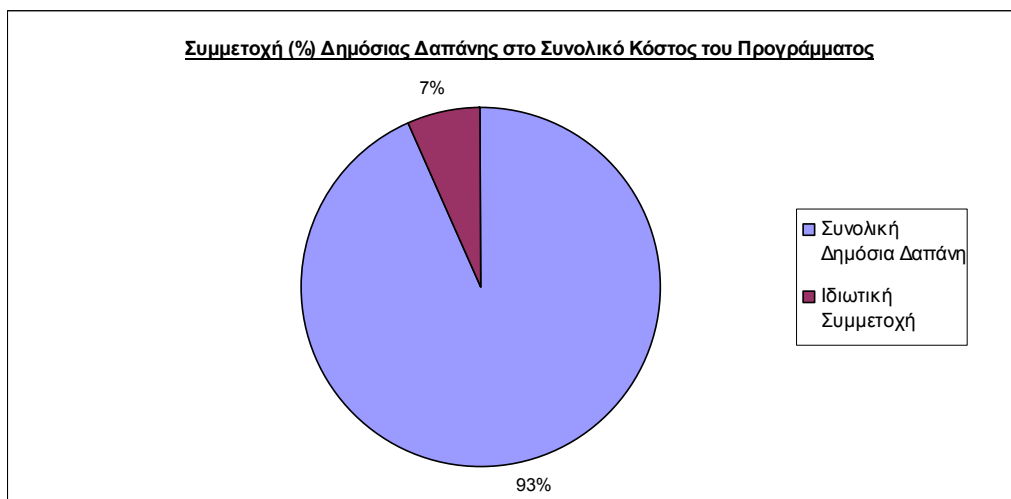

Σημειώνεται ότι, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10% της κοινοτικής συνδρομής του κάθε Άξονα Προτεραιότητάς του ("ρήτρα ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (ήτοι δράσεις ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν.

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4, 5, 7, 8 και 9 προβλέπεται να γίνει χρήση της "ρήτρας ευελιξίας" για τη χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ, οι οποίες θα συμβάλουν κατά τρόπο

συμπληρωματικό στην υλοποίηση των ενδεικτικών κύριων κατηγοριών παρεμβάσεων των εν λόγω Αξόνων Προτεραιότητας.

Ο Πίνακας που ακολουθεί σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εφαρμογής του Ε.Π. περιλαμβάνει μόνο τις πληρωμές που ελήφθησαν από την Επιτροπή ως προκαταβολή σωρευτικά για τα έτη 2007-2008, ενώ οι δαπάνες από την υλοποίηση του ΠΕΠ δεν έχουν δηλωθεί έως 31/12/2008.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΜΑ.ΘΡΑ.)"						
Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)						
Άξονας προτεραιότητας		Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή ΣΥΝΟΛΟ 2008
ΑΠ 1	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΚΜ – Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (phasing out) (ΕΤΠΑ)					10.208.700
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 2	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ – Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (phasing out) (ΕΤΠΑ)					2.219.400
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 3	Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΑΜΘ – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)					6.348.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 4	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ – Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (phasing out) (ΕΤΠΑ)					15.537.510
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 5	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου – στην ΠΔΜ – Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (phasing out) (ΕΤΠΑ)					2.866.200
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 6	Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ'					480.000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΜΑ.ΘΡΑ.)"						
Άξονας προτεραιότητας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε ευρώ)						
Άξονας προτεραιότητας	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από τους δικαιούχους και συμπεριλαμβάνονται στις αιτήσεις πληρωμής που απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή	Αντίστοιχη δημόσια συνεισφορά	Ιδιωτικές δαπάνες	Δαπάνες που καταβλήθηκαν από το φορέα που είναι αρμόδιος για την καταβολή των πληρωμών στους δικαιούχους	Σύνολο των πληρωμών που ελήφθησαν από την Επιτροπή	ΣΥΝΟΛΟ 2008
	(ΕΤΠΑ)					
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 7	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ – Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (phasing out) (ΕΤΠΑ)					26.851.170
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 8	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΔΜ – Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (phasing out) (ΕΤΠΑ)					7.319.400
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 9	Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)					7.284.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 10.1	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ – Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (phasing out) (ΕΤΠΑ)					847.620
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
ΑΠ 10.2	Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΑΜΘ – Αμιγής Στόχος 'ΣΥΓΚΛΙΣΗ' (ΕΤΠΑ)					288.000
	Εκ των οποίων δαπάνες τύπου ΕΚΤ					0
Γενικό σύνολο						80.250.000
Δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ επί του γενικού συνόλου						0

1.1.3 Στοιχεία σχετικά με την ανάλυση της χρήσης των ταμείων

Ο παρακάτω πίνακας, ο οποίος παρουσιάζει μία σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία δεν θα συμπληρωθεί αλλά θα υποβληθεί πίνακας excel με στοιχεία προϋπολογισμού ένταξης, ο οποίος θα σταλλεί ως διακριτό αρχείο από το κυρίως κείμενο της έκθεσης, όπως άλλωστε έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Πίνακας παρουσιάζεται στο Παράρτημα του Παρόντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Σωρευτική ανάλυση των κονδυλίων της κοινοτικής συνδρομής ανά κατηγορία

Συνδυασμός κωδικών των διαστάσεων 1 έως 5					
Κωδικός * Διάσταση 1 Θέμα προτεραιότητας	Κωδικός * Διάσταση 2 Μορφή χρηματοδότησης	Κωδικός * Διάσταση 3 Έδαφος	Κωδικός * Διάσταση 4 Οικονομική δραστηριότητα	Κωδικός * Διάσταση 5 Γεωγραφική περιοχή	Ποσό **
Σύνολο					

* Οι κατηγορίες θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένες για κάθε διάσταση σύμφωνα με την τυποποιημένη ταξινόμηση.

** Χορηγούμενο ποσό της κοινοτικής συνδρομής για κάθε συνδυασμό κατηγοριών.

1.1.4 Συνδρομή ανά ομάδα – στόχο

Λόγω του ότι κατά, το έτος αναφοράς δεν υπήρχε σημαντική εξέλιξη στην φυσική πρόοδο , δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε ομάδες στόχους.

1.1.5 Ανάκτηση ή εκ νέου χρήση της συνδρομής

. Ομοίως λόγω μη εμφάνισης δαπανών στο Πρόγραμμα κατά το έτος αναφοράς δεν υφίστανται θέματα ανάκτησης της συνδρομής.

1.1.6 Ποιοτική ανάλυση

Λαμβάνοντας υπόψη τη μη εμφάνιση στοιχείων υλοποίησης κατά το έτος αναφοράς, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση, των επιτευγμάτων του Προγράμματος.

Σε , ότι αφορά τη συνδρομή του Προγράμματος στη Στρατηγική της Λισσαβόνας και την συνάφειά του με τα επί μέρους σχετικά έγγραφα και πολιτικές, όπως ΕΠΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013, Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Κοινότητας (ΣΚΓΚ) και Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές (ΟΚΓ), υπάρχει σχετική αναφορά, στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας.

Τέλος, ως προς τις συνέπειες του Προγράμματος στην προώθηση των ίσων ευκαιριών,, γίνεται αναφορά στο Κεφάλαιο 4.2.

1.2 Στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το Κοινωνικό Δίκαιο

Όπως είναι αναμενόμενο, λόγω της μη εμφάνισης φυσικής και οικονομικής προόδου του Προγράμματος, κατά το έτος 2008, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα ως προς τη συμμόρφωση με το κοινωνικό δίκαιο. Εντούτοις στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της προετοιμασίας του σχεδιασμού των μηχανισμών εφαρμογής (διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου) του Προγράμματος κυρίαρχη κατεύθυνση είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης των πράξεων και διαδικασιών εφαρμογής του Προγράμματος με το κοινωνικό δίκαιο.

1.3 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω περιορισμένης προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

1.3.1 Αλλαγές στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το γεγονός που σημάδεψε το έτος 2008 είναι αναμφίβολα η κρίση, που αρχικά μεν ξέσπασε στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στην χειρότερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής εποχής για την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζοντας αρνητικά όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργώντας πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Τα δημόσια οικονομικά χειροτέρευσαν σε όλες τις χώρες. Το έλλειμμα έφτασε το 2 % του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη το 2008 και αναμένεται να εκτιναχθεί πλέον του 5 % του ΑΕΠ το 2009. Οι ρυθμοί ανάπτυξης υποχωρούν σε όλο τον κόσμο και στο

πλαίσιο της Ευρωζώνης έχουν γίνει αρνητικοί με εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εξέλιξη της πορείας των οικονομιών της ευρωζώνης είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Το συμπέρασμα στο τελευταίο Ecofin είναι, ότι η ύφεση στην ευρωζώνη θα είναι μεγαλύτερης έντασης απ' ότι είχε εκτιμηθεί μόλις πριν από μερικούς μήνες. Μέχρι το 2010 αναμένεται να προστεθούν 8 εκατ. επιπλέον άνεργοι. Ο φόβος για κοινωνικές εκρήξεις απλώνεται σε όλη την Ευρώπη.

Μέσα σε αυτή τη διεθνή κρίση η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Τα δεδομένα δεν είναι πλέον τα ίδια με όσα επικρατούσαν και προϋπολογίζονταν το φθινόπωρο του 2008.

- Ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται σημαντικά. Από την αρχική εκτίμηση για ρυθμό της τάξεως του 2,8 – 3,0% για το 2009, σήμερα υπολογίζεται γύρω στο 0,5 %.
- Τα δημόσια έσοδα εμφανίζεται να περιορίζονται έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και προβλέψεων του προϋπολογισμού.
- Η ανεργία, που σταδιακά και σταθερά μειωνόταν τα τελευταία 5 χρόνια, εμφανίζει και πάλι αυξητικές τάσεις και ρυθμούς.

Οι ανάγκες για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων αυξάνονται. Ειδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης, τέθηκαν σε εφαρμογή στις περισσότερες χώρες.

Η ελληνική θέση για την αντιμετώπιση της κρίσης περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

- **τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος και του χρέους.**
- **τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.**
- **τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.**

Στα ειδικά μέτρα για τη **στήριξη της πραγματικής οικονομίας περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων:**

- Η παροχή εγγυήσεων για όλες τις καταθέσεις στις τράπεζες καθώς και τα μέτρα για την προστασία των δανειοληπτών.
- Το ειδικό σχέδιο για τις τράπεζες και την ενίσχυση της ρευστότητας, συνολικού ύψους 28 δισεκατομμυρίων ευρώ.

- Η στήριξη, με χαμηλότοκα δάνεια, ύψους 9,5 δισ. ευρώ, 80.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για δανειοδότηση σε ποσοστό 100% για την αγορά κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και ο διπλασιασμός του αφορολόγητου για τους τόκους των στεγαστικών δανείων για ανέγερση ή αγορά κατοικίας.
- Η ενίσχυση μέσω του επενδυτικού νόμου πάνω από 6.000 επενδύσεων, συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ που θα δημιουργήσουν πάνω από 28.500 νέες θέσεις απασχόλησης.
- Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, από τους πόρους του οποίου θα αντληθούν, μέσα στο 2009, δαπάνες περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να στηρίξουν την ανάπτυξη, την απασχόληση, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος.
- Η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ΣΔΙΤ σε έργα υποδομών της χώρας παράλληλα προς την υλοποίηση ή ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής.
- Η προκήρυξη, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, προγραμμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που κτίστηκαν πριν το 1980, αφενός μεν δίνοντας ώθηση τόσο στη βιομηχανία δομικών υλικών, όσο και σε συναφή με τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλματα, αφετέρου και παράλληλα δε ενισχύοντας το εισόδημα των νοικοκυριών με τη μείωση των δαπανών τους για ενέργεια.
- Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις 4 χώρες της Ε.Ε. που βρίσκονται μέσα στους στόχους του πρωτοκόλλου του Κιότο.
- Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αποτέλεσμα να τριπλασιαστεί η εγκατεστημένη ισχύς.
- Η λήψη και εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων και μέτρων για τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας όπως εκείνοι των τουριστικών επιχειρήσεων, της οικοδομής, των εξαγωγών και του αυτοκινήτου.

Για τη στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων αποφασίσθηκε μεταξύ των άλλων:

- Η διασφάλιση πόρων 22 δισ. ευρώ ως το 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης με παράλληλη ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος με επιπλέον 500 εκ. ευρώ.
- Η δημιουργία περισσότερων από 1.800 ολόημερων νηπιαγωγείων και δημοτικών για τη στήριξη της εργαζόμενης οικογένειας αλλά και 55 νέων ειδικών σχολείων για ΑμεΑ σε όλη τη χώρα.
- Η αύξηση κατά 63% των δαπανών για το κοινωνικό κράτος, σε σύγκριση με το 2004.

- Η διάθεση 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, μέσω του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής.
- Η αύξηση του επιδόματος ανεργίας από 299 ευρώ στα 431 ευρώ.

1.3.2 Ουσιαστική τροποποίηση βάσει του άρθρου 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

Με δεδομένη τη μη εμφάνιση ένταξης και υλοποίησης πράξεων του Προγράμματος κατά το 2008, είναι προφανές ότι δεν υπήρξαν περιπτώσεις, στις οποίες εντοπίστηκε σημαντική τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

1.4 Συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα

Από το σχεδιασμό του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» έχουν προβλεφθεί διαδικασίες / ρυθμίσεις για την εξασφάλιση συμπληρωματικότητας και συντονισμού των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής, καθώς και για την εξασφάλιση της οριοθέτησης «διαχωρισμού», μεταξύ των παρεμβάσεων των Ε.Π με αυτές που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, το ΕΤΑ και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ. 4 του Κ (ΕΚ) 1083/2006. Συγκεκριμένα και όπως αναφέρεται στο αντίστοιχο σημείο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ο κύριος όγκος των παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της προσπελασιμότητας των αγροτικών περιοχών και τις παρεμβάσεις σε υποδομές περιβάλλοντος, θα καλυφθεί από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η ενίσχυση μεγάλης κλίμακας επενδυτικών σχεδίων, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αναβάθμιση του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα καλυφθούν από το ΕΤΠΑ, ενώ η αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και οι παρεμβάσεις στους ανθρώπινους πόρους, θα καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχουν θεσπισθεί συγκεκριμένα κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων σε σχέση με τα μέσα χρηματοδότησης κάθε παρέμβασης. Η θέσπιση δε των κριτηρίων διαχωρισμού μεταξύ των ομοειδών κατηγοριών πράξεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από τα διαφορετικά Ταμεία δεν διαπνέεται από «διαχειριστική» λογική, αλλά αντανακλά τις προτεραιότητες των επιμέρους πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, πολιτική

αγροτικής ανάπτυξης, αλιευτική πολιτική), το σύνολο των οποίων επηρεάζεται από τη διάσταση του χώρου.

Θα πρέπει δε να ληφθεί υπόψη ότι η μεγάλη έκταση των αγροτικών περιοχών, το μήκος της ακτογραμμής και άλλα χαρακτηριστικά της χωρικής ενότητας καθιστούν απαγορευτική την υιοθέτηση ως μόνου κριτηρίου διαχωρισμού των πράξεων των Ταμείων το «χωρικό – γεωγραφικό» κριτήριο, διότι είναι δεδομένο ότι οι πόροι του ΕΓΤΑΑ και του ΕΤΑ δεν επαρκούν για να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες στις δυο γενικές ομάδες παρεμβάσεων, μέσω των οποίων θα εξυπηρετηθούν ο στόχος της διαφοροποίησης της οικονομίας των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία, καθώς και ο στόχος της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές. Αυτές οι δύο γενικές ομάδες παρεμβάσεων αφορούν στις παρεμβάσεις επί του παραγωγικού περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για έργα υποδομών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Παράλληλα, όμως, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα θέσπισης κριτηρίων, η οποία εντοπίστηκε στους ακόλουθους τομείς παρεμβάσεων:

- Δράσεις κατάρτισης – Ανθρώπινο δυναμικό
- Παρεμβάσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος
- Παρεμβάσεις με βάση την προσέγγιση LEADER που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ
- Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών μέσω μιας τοπικής στρατηγικής, που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΑ.

Ως εκ τούτου και με βάση την παραπάνω προσέγγιση, τα κριτήρια διαχωρισμού των πράξεων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αποτελούν ένα συγκερασμό χωρικών – γεωγραφικών, οικονομικών και διοικητικών κριτηρίων.

Λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον επτά (7) ετών, τα κριτήρια διαχωρισμού μπορούν να συμπληρωθούν ή/και να αναθεωρηθούν, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

1.5 Ρυθμίσεις παρακολούθησης

1.5.1 Κανονιστικά θέματα

Με την απόφαση με αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των δεκατριών Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση».

Το ΣΔΕ σχεδιάστηκε με βασικούς στόχους την ικανοποίηση των απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους Κανονισμούς 1083/2006 και 1828/2006, την αξιοποίηση της εμπειρίας από τη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ και την εισαγωγή παραμέτρων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των διοικητικών λειτουργιών και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, στην πρόληψη αστοχιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό του διαχειριστικού κόστους.

Το ΣΔΕ είναι κοινό για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Στόχων «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση» δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του Συστήματος είναι κοινά. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο το οποίο θέτει τους όρους για τη διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων Περιλαμβάνει τον ορισμό της Διαχειριστικής Αρχής και των επί μέρους Αρχών που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης σε κάθε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και τον ορισμό της Αρχής Πιστοποίησης και της Αρχής Ελέγχου, που είναι κοινές για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επίσης περιλαμβάνει ένα σύνολο στοιχείων που απαιτούνται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό όπως την αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που εφαρμόζουν η Διαχειριστική Αρχή, οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, η Αρχή Πιστοποίησης και η Αρχή Ελέγχου και τα έντυπα που χρησιμοποιούν, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για παρατυπίες και ανακτήσεις, τους κανόνες τήρησης του Κοινοτικού Δικαίου.

Το ΣΔΕ θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) «*Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013*», στον οποίο προσδιορίζονται οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, οι κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και η οργανωτική δομή των εμπλεκόμενων αρχών, καθώς και μία σειρά μέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013.

Συνεπώς, αρμοδιότητες διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» ασκούνται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, την Ε.Δ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, την Ε.Δ.Α. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών 2007 – 2013, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 και Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

1.5.2 1^η Επιτροπή Παρακολούθησης

Η **Επιτροπή Παρακολούθησης του «Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007 - 2013»**, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 4166/ΕΥΣ530/30-1-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, συνήλθε σε 1^η συνεδρίαση στις 20.02.2008 στην Καστοριά με την υπ' αριθ. 1237/11-02-2008 πρόσκληση του Προέδρου της Επ.Πα. ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης.

Σε αυτήν προεδρεύουν για ένα χρόνο εκ περιτροπής, ξεκινώντας από το 2008, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστοιχα, οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια που προεδρεύει κάθε φορά.

Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου είναι, πέραν των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, οι:

- Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης
- Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος
- Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών συντονισμού και της ΜΟΔ Α.Ε.
- Εκπρόσωποι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας (ΕΝΑΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ)
- Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων
- Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν και άλλα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κλπ.

Κατά την πρώτη της συνεδρίαση, η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης και ενημερώθηκε για τις διαδικασίες στις οποίες θα προβεί η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επισημάνθηκε ότι το Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγράμματος αποτελεί εργαλείο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και υλοποίηση του ΠΕΠ και το μόνο επίσημο έγγραφο παραμένει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

, Η Επιτροπή Παρακολούθησης ενέκρινε τις βασικές κατηγορίες κριτηρίων ένταξης πράξεων στο ΠΕΠ « ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013»

Τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης έλαβε γνώση των διαδικασιών κατάρτισης καθώς και του περιεχομένου του Επικοινωνιακού Σχεδίου για τη Δημοσιότητα του ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013.

1.5.3 Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Προγράμματος.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, η παρακολούθηση (monitoring) αποτελεί μια βασική παράμετρο αφού παρέχει τη δυνατότητα τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να συγκρίνονται με τις πραγματικά προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι βασικές αρχές της παρακολούθησης της ΣΠΕ καθώς και η σύνδεσή της με την αξιολόγηση των Ε.Π. τέθηκαν στη σχετική Εγκύκλιο, που καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΥΣΣΑΑΠ) (Παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, Α.Π.: 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485, 10.6.2008).

Τα βασικά εργαλεία για την «περιβαλλοντική παρακολούθηση» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 4ης προγραμματικής περιόδου είναι:

- i. Η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- ii. Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων
- iii. Η εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, και
- iv. Τα στοιχεία παρακολούθησης της υλοποίησης των ΕΠ συμπεριλαμβανομένων σχετικών δεικτών υλοποίησης.

Η παρακολούθηση θα διεξάγεται μέσω ετήσιων και συγκριτικών εκθέσεων, όπως ορίζεται στις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των ΕΠ. Οι ετήσιες εκθέσεις

περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα αφορούν τα πεπραγμένα κάθε έτους και θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται εντός του επομένου έτους έως και 30 Απριλίου. Οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΥΠΟΙΟ, καθώς και στην αρμόδια ειδική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, που θα συντονίζει και θα παρακολουθεί το σύνολο των περιβαλλοντικών έργων ενώ παράλληλα θα τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Η πρώτη ετήσια έκθεση παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης θα αφορά το έτος 2008 περιλαμβάνοντας και τα πεπραγμένα του 2007 και κατ' εξαίρεση θα υποβληθεί μέχρι 30^η Σεπτεμβρίου 2009 αφού οριστικοποιηθούν οι προδιαγραφές κατάρτισης των ετήσιων εκθέσεων.

Η περιβαλλοντική παρακολούθηση των ΕΠ αποτελεί ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής με τη συνδρομή και συνεργασία της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, που ενδεχομένως συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η διαχείριση όλων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και ως εκ τούτου και του Ε.Π. «Μακεδονία - Θράκη» ασκείται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ενώ με βάση το άρθρο 6 του ν.3614/2007 καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής του παρόντος Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Για τον καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής παρακολούθησης ανατέθηκε το 2009 από την ΕΑΣ (ΕΥΣΣΑΑΠ) σε εμπειρογνώμονα το έργο της υποστήριξης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σε σχέση με την παρακολούθηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τέλος, εντός του 2009 συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας στο πλαίσιο της ΕΑΣ με στόχο την εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ μέσω σχετικών εισηγήσεων, προτάσεων και γνωμοδοτήσεων στα σχετικά θέματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ

Στο πλαίσιο της περιόδου αναφοράς της παρούσας έκθεσης, οι ενέργειες Ύενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας” που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 7 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Κεντρικής Μακεδονίας” συνέβαλαν με 16.600.000 ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής (σε όρους Π/Υ ένταξης) στην εφαρμογή του Γενικού Στόχου 9 του ΕΣΠΑ (Πρώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης) και του Ειδικού Στόχου του που αφορά σε Ύστοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη ατόμων που χρήζουν βοήθειας”.

Οι ενέργειες σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JEREMIE που εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Κεντρικής Μακεδονίας” και “Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Δυτικής Μακεδονίας” με 16.118.400 ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής (σε όρους Π/Υ ένταξης), συμβάλλουν στην εφαρμογή του Γενικού Στόχου 2 του ΕΣΠΑ (Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας). Παράλληλα εμφανίζουν άμεση συνάφεια με τη Στρατηγική Κατευθυντήρια Γραμμή της Πολιτικής Συνοχής «Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση» καθώς και με την Ολοκληρωμένη Κατευθυντήρια Γραμμή για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση Ύ15 - Να προωθηθεί μία περισσότερο επιχειρηματική νοοτροπία και να δημιουργηθεί περιβάλλον που να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)”.

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να συνεισφέρουν με 32.718.400 ευρώ Κοινοτικής Συνδρομής για το Στόχο 1-Σύγκλιση στην επίτευξη του εθνικού χρηματοδοτικού στόχου που έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ για την ατζέντα της Λισσαβώνας (Earmarking).

Σημειώνεται επίσης, ότι κατά την περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης προόδου υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2008-2010, με τις εξής προτεραιότητες:

- Συνέχιση της δημοσιονομικής εξυγίανσης και εξασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

- Ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, κυρίως μέσω μεταρρυθμίσεων αλλά και από την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση, στη λειτουργία των αγορών, τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την προώθηση της Κοινωνίας της Γνώσης.
- Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυση του ανταγωνισμού, άνοιγμα των αγορών, αύξηση της εξωστρέφειας αλλά και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
- Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στην απασχόληση, μείωση της ανεργίας, καθώς και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και επανακατάρτισης.

Οι στρατηγικές επιδιώξεις που αφορούν στη συμβολή του ΕΣΠΑ και των Προγραμμάτων του στο ΕΠΜ αναπτύσσονται σε τέσσερα επίπεδα:

A) Αύξηση της χρηματοδοτικής προσπάθειας που καταβάλλεται σε εθνικό επίπεδο μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του ΕΣΠΑ για την εξυπηρέτηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, συγκριτικά με το Γ ΚΠΣ.

B) Μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ΕΣΠΑ και των ΕΠ στο επίπεδο των ποσοτικών στόχων ή/και δεικτών της Λισσαβόνας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σχετική θέση της χώρας σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ (όπως παρακολουθείται περιοδικά με τους διαρθρωτικούς δείκτες), τόσο σε ονομαστικούς όσο και σε πραγματικούς όρους.

Γ) Συμβολή στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων του ΕΠΜ, διασφάλιση της συνέπειας των Επ. Προγραμμάτων με τις 24 Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές και ανταπόκριση στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ελλάδα.

Δ) Συντονισμός ΕΣΠΑ και ΕΠΜ στα επίπεδα του σχεδιασμού, εφαρμογής, διαχείρισης, στρατηγικής παρακολούθησης και αξιολόγησης. Ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ και το Νόμο 3614/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται, ανά άξονα προτεραιότητας, τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, με βάση όσα αποτυπώθηκαν ήδη στην παράγραφο 1.1. ως προς την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατά το έτος αναφοράς της παρούσας Έκθεσης (2008). Σημειώνεται ότι όσον αφορά τις τιμές αφετηρίας και στόχους στους πίνακες δεικτών, τα στοιχεία και οι σχετικές αναφορές έχουν αντληθεί από το ΕΠ στο οποίο υπάρχει αναλυτική παρουσίαση

3.1 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

3.1.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Όσον αφορά στο συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας, στόχος του περιφερειακού σχεδιασμού είναι η συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού δικτύου αστικών κέντρων, συνδεδεμένου λειτουργικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN).

Η ανάπτυξη της Περιφέρειας, σχετικά με τις υποδομές και τις υπηρεσίες προσπελασιμότητας, διατυπώνεται με την ολοκλήρωση των συγκοινωνιακών και μεταφορικών υποδομών της, μέσω επιμέρους ειδικών στόχων, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Το 2008 και στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 **εξειδικεύτηκαν** 206.000.000 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, στους παρακάτω κωδικούς θέματος προτεραιότητας:

- 20 «Αυτοκινητόδρομοι», προϋπολογισμού 110.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 23 «Περιφερειακές / τοπικές οδοί», προϋπολογισμού 96.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης.

Εξ αυτών **εκχωρήθηκαν** 140.382.798 €, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

- 20 «Αυτοκινητόδρομοι», εκχώρηση ύψους 92.381.387 € συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης και πρόσθετοι εθνικοί πόροι ύψους 17.618.613 €. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 110.000.000 €,
- 23 «Περιφερειακές / τοπικές οδοί», εκχώρηση ύψους 48.001.411 € Δημόσιας Δαπάνης.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε δημοσίευση δύο (2) **προσκλήσεων** εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 158.000.000 €:

- 23 «Περιφερειακές / τοπικές οδοί», προϋπολογισμού 48.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης. Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 11/08/2008 και το πρώτο τρίμηνο υποβολής προτάσεων έληξε στις 11/11/2008. Η αξιολόγηση ξεκίνησε στις 15/12/2008.
- 20 «Αυτοκινητόδρομοι», προϋπολογισμού 110.000.000 € συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 05/12/2008 και το πρώτο τρίμηνο υποβολής προτάσεων λήγει στις 05/03/2009.

Επιπλέον, κατά το έτος αναφοράς, εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών η πρόσκληση με κωδικό 3/17-11-2008 στο πλαίσιο της Θεματικής προτεραιότητας 17, κατηγορία πράξης «Κατασκευή – αναβάθμιση σιδηροδρομικών γραμμών TEN-T», προϋπολογισμού 40.001.176 ευρώ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εντός TEN-T. (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	30									
Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητόδρομων εκτός TEN-T. (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	21,68									
Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										24
	Αφετηρία	292,82									
Κατασκευή και αποπεράτωση σιδηροδρόμων εντός TEN (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	0									
Αποτελέσματα											
Μείωση χρονοαπόστασης (Min)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										60
	Αφετηρία										
Αναβάθμιση περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0,3%
	Αφετηρία	3,6%									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.1.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.2 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

3.2.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι:

- Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλέγματος επικοινωνίας με τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας.
- Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ιδίως προς τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, μέσω βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της ανάπτυξης πολυθεματικών συνεργασιών.

Οι γενικοί αυτοί στόχοι εξειδικεύονται σε ειδικούς, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα, παρουσιάζονται παρακάτω τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εκτός TEN-T. (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										14
	Αφειτηρία	32									
Βελτίωση - κατασκευή εθνικής οδοποιίας (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										22,22
	Αφειτηρία	38									
Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										13,34
	Αφειτηρία	125									
Αποτελέσματα											
Αναβάθμιση αυτοκινητοδρόμων εκτός TEN, Εθνικού / περιφερειακού / τοπικού οδικού δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφειτηρία	10									
Προσπελασιμότητα (Υπολογίζεται μόνο για τους αυτοκινητόδρομους) (Χλμ / ώρα)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφειτηρία	90									

- Όσον αφορά στις τιμές αφειτηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.2.2. Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.3 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

3.3.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στόχος του Άξονα Προτεραιότητας είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε χώρους ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων (ΒΙ.ΠΕ. και λιμάνια) και σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και στη συμπλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου και τη σύνδεσή του με χώρους οικονομικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επιδιώκεται η συμπλήρωση και η κατασκευή των καθέτων, ως προς τη γεωγραφική ανάπτυξη της Περιφέρειας, οδικών αξόνων, παράλληλα με την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των μεθοριακών σταθμών, σημαντική συνιστώσα για την Περιφέρεια, δεδομένου ότι, εξασφαλίζουν την προοπτική αξιοποίησης των βορειοανατολικών χερσαίων συνόρων της χώρας, ζήτημα αυξημένης γεωπολιτικής σημασίας στο πλαίσιο της διεύρυνσης της Ε.Ε. στα ανατολικά Βαλκάνια.

Οι παραπάνω στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα, παρουσιάζονται παρακάτω προσκλήσεις που εκδόθηκαν εντός του 2008 καθώς και προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας. , Με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων , συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Εντός του 2008, και αφού προηγήθηκε η εξειδίκευση και εκχώρηση αντίστοιχων ποσών στους κωδικούς 22 και 23, εκδόθηκαν οι εξής προσκλήσεις:

- 1.** Πρόσκληση στον Άξονα προτεραιότητας 3 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ» Κωδικό θεματικής Προτεραιότητας 23 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ», δημόσιας δαπάνης 18.444.967 €.
- 2.** Πρόσκληση στον Άξονα προτεραιότητας 3 «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π-ΑΜΘ» Κωδικό θεματικής Προτεραιότητας 22 «ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ», δημόσιας δαπάνης 57.302.364 €.

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής εκτός TEN-T (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	443,5									
Ολοκλήρωση κατασκευής αυτοκινητοδρόμων εντός TEN-T.(Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										39
	Αφετηρία	190									
Βελτίωση – κατασκευή εθνικής οδοποιίας (χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	65									
Βελτίωση κατασκευή οδών εκτός αυτοκινητόδρομων και εθνικής οδοποιίας (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	116									
Αριθμός λιμένων που αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	8									
Αποτελέσματα											
% αναβάθμισης Εθνικού Οδικού Δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία	8%									
% αναβάθμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5%
	Αφετηρία	6%									

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.3.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.4 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

3.4.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας και όσον αφορά στους τομείς επιχειρηματικότητας και ενέργειας, στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, που ασκείται στην Κεντρική Μακεδονία και η ενσωμάτωση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, η οποία οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας (ιδιαίτερα στον τριτογενή τομέα), που ενσωματώνουν γνώση, περιβαλλοντική μέριμνα και καινοτομία.

Για τον τομέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης η στρατηγική αναπτύσσεται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των προκλήσεων και της εκμετάλλευσης ευκαιριών στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης. Τέλος, όσον αφορά στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στόχο του Άξονα αποτελεί η διάχυσή τους, τόσο στις επιχειρήσεις – με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας της Περιφέρειας, όσο και στους πολίτες – με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη χρήση των ΤΠΕ, με την προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Ο παραπάνω στόχος εξειδικεύεται σε δύο προτεραιότητες:

- α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ, και
- β) τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σε ότι αφορά παρεμβάσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, στις 16/10/2008 εκδόθηκε η πρώτη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στο σύνολο της χώρας συμπελαμβανομένου του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του ΕΠ Μακεδονίας Θράκης. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1^ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι 100Μ€ (Δ.Δ.) Στις 21/10/2008 εκδόθηκε η δεύτερη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 4. Ο διαθέσιμος

προϋπολογισμός για τον 1^ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι 100.000.000 € (ΔΔ)
Η διαδικασία των προσκλήσεων είναι συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινάει νέος κύκλος υποβολής.

Οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας που έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση προσκλήσεων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και για τους οποίους έχουν υποβληθεί προτάσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας			ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	
Κωδ.	Θεματική Προτεραιότητα	Π/Υ Δέσμευσης στον Κωδικό	Κωδικός- Ημ/νία έκδοσης Πρόσκλησης	Π/Υ Πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (συνολική ΔΔ)
13	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)	78.826.685,00	01_2.2 16/10/2008	15.000.000,00
12	Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)	6.327.031,00	02_1.2 21/10/2008	3.460.000,00
14	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)	21.078.013,00	02_1.2 21/10/2008	11.540.000,00

Οι φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε ό,τι αφορά την υποβολή προτάσεων

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΕ 2007-2013 στο πλαίσιο του άξονα 4 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έχουν εξειδικευτεί στο μεγαλύτερο ποσοστό Συγκεκριμένα έχουν εξειδικευτεί παρεμβάσεις ποσού 294.967.056 € επί συνολικής δέσμευσης του ΠΕΠ προς τον ΕΦΔ ποσού 366.765.340 €, ποσοστό 80,4%.

.Συνολικά εγκρίθηκαν εκχωρήσεις στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 03, 04, 05, 09, 33 και 35 συνολικού προϋπολογισμού 48.583.000 €.

Προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί έως 31.12 2008 σε Δικαιούχους και αφορούν σε έργα υποδομής, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αφορούν:

- Πρόσκληση σε Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Εποπτεία της Αγοράς - Α' Φάση» (Α.Π. 13680/Α2/4/12.11.2008), συνολικού π/υ 1.800.000 € (χρηματοδότηση 100%).

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 273.600 € του συνολικού π/υ της

- Πρόσκληση σε Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και ευστάθειας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (Α.Π. 14286/A2/5/25.11.2008), συνολικού π/υ 11.333.333 € και δημόσιας δαπάνης 5.100.000 €

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό δημόσιας δαπάνης 1.154.640 €.

- Πρόσκληση στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της ευστάθειας του συστήματος. Μετρήσεις Ενέργειας που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίσπευση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί και η αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς» (Α.Π. 15876/A2/7/18.12.2008) συνολικού π/υ 3.883.382 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 621.978 € του συνολικού π/υ της πρόσκλησης.

Αναφορικά με τα έργα κρατικών ενισχύσεων έχουν προκηρυχθεί και αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι ακόλουθες πράξεις:

- «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική – Ενίσχυση φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 33.000.000 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 1.650.000 € της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

- «Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Vouchers for SME's» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.400.000 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 940.000 € της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

- «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (Α.Π. 28519/3298/23.12.2008), συνολικής δημόσιας δαπάνης 100.000.000 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό δημόσιας δαπάνης 11.700.000 €.

Οι παραπάνω στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα, παρουσιάζονται παρακάτω τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Μήκος αγωγών Φ.Α. μέσης και χαμηλής πίεσης (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										526
	Αφετηρία	969,64									
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΜW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										102
	Αφετηρία	105,73									
Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτομίας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										148
	Αφετηρία	0									
Αριθμός νέων / υποστηριζόμενων επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin-off και spin-out) (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										7
	Αφετηρία	2									
Αριθμός υφιστάμενων επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται -ΓΓΒ, Εμπόριο, Τουρισμός (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										512
	Αφετηρία	459									
Αριθμός υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται - βελτιώνονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										496
	Αφετηρία	352									
Αριθμός επιχειρήσεων που δημιουργούνται από επιδοτούμενα προγράμματα (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										32
	Αφετηρία	155									
Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5.015
	Αφετηρία	5.835									
Αριθμός νέων τουριστικών κλινών (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										250
	Αφετηρία	111.580									
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
Επωφελούμενοι πολίτες από χρηματοδοτούμενους εξοπλισμούς ΤΠΕ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										99.439
	Αφετηρία	0									
Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	0									
Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4.150
	Αφετηρία	1.294									
Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και Χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										85
	Αφετηρία	0									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Αποτελέσματα											
Ετήσια δεσμευμένη μεταφορική ικανότητα αγωγών Φ.Α. μέσης και χαμηλής πίεσης (Εκατ.Κ.μ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										80
	Αφετηρία	393									
Πληθυσμός που καλύπτεται από Φ.Α. (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										277.745
	Αφετηρία	721.002									
Ποσοστό πληθυσμού που καλύπτεται από Φ.Α. (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2,5%
	Αφετηρία	6,6%									
Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από επενδύσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΤΙΠ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										54.544
	Αφετηρία	0									
Ισοδύναμα ανθρωποέτη απασχόλησης ερευνητών κατά την υλοποίηση του ΕΠ (Ισοδυν. Ανθρ/ετη 12Μ Διάρκειας)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										580
	Αφετηρία	0									
Αριθμός νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την ενίσχυση των επιχειρήσεων (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										760
	Αφετηρία	2.218									
Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία	5,5%									
Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από Δομές Στήριξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3.828
	Αφετηρία	0									
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										14%
	Αφετηρία	6%									
Ποσοστό πολιτών που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης) (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										14%
	Αφετηρία	7%									
Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα υποδοχής Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										11,77%
	Αφετηρία	8,93%									
Χρηματοδοτούμενες Επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω Διαδικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,77%
	Αφετηρία	0,82%									
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του δημοσίου που είναι πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (% επί του συνόλου των επιχειρήσεων της περιφέρειας)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100,00%
	Αφετηρία	91,72%									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.4.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της ύπαρξης ενταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.5 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

3.5.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι:

- Δημιουργία συνθηκών για τη διαφοροποίηση της ιδιαίτερα συναρτώμενης με τον τομέα της ενέργειας παραγωγικής βάσης και προσαρμογή της στις διεθνείς απαιτήσεις.
- Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με παράλληλη αξιοποίηση των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Στις 16/10/2008 εκδόθηκε η πρώτη Πρόσκληση από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΨΣ 2007-2013, η οποία αφορά στο σύνολο της χώρας συμπεριλαμβανομένου του άξονα Προτεραιότητας 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα του ΕΠ Μακεδονίας – Θράκης. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι 100Μ€ (Δ.Δ.) Στις 21/10/2008 εκδόθηκε η δεύτερη Πρόσκληση από τον ΕΦΔ η οποία αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 5. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τον 1ο κύκλο υποβολής προτάσεων είναι 100.000.000,00 € (ΔΔ) Η διαδικασία των προσκλήσεων είναι συνεχής με περιοδικότητα τριμήνου. Με την ολοκλήρωση ενός κύκλου, ξεκινάει νέος κύκλος υποβολής.

Οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας που έχουν ενεργοποιηθεί με την έκδοση προσκλήσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για τους οποίους έχουν υποβληθεί προτάσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας			ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	
Κωδ.	Θεματική Προτεραιότητα	Π/Υ Δέσμευσης στον Κωδικό	Κωδικός- Ημ/νία έκδοσης Πρόσκλησης	Π/Υ Πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (συνολική ΔΔ)

Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας			ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ	
Κωδ.	Θεματική Προτεραιότητα	Π/Υ Δέσμευσης στον Κωδικό	Κωδικός-Ημ/νία έκδοσης Πρόσκλησης	Π/Υ Πρόσκλησης ανά ΚΘΠ (συνολική ΔΔ)
13	Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ηλεκτρονική εκμάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση , κ.λ.π.)	17.381.068,00	01_2.2 16/10/2008	3.000.000,00
12	Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (TEN-ICT)	1.412.212,00	02_1.2 21/10/2008	480.000,00
14	Υπηρεσίες και εφαρμογές για ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λ.π.)	7.398.536,00	02_1.2 21/10/2008	2.520.000,00

Οι φορείς που εδρεύουν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε ό,τι αφορά την υποβολή προτάσεων στις προσκλήσεις του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Ειδικότερα οι προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά στην Περιφέρεια (δεν περιλαμβάνονται προτάσεις εθνικής εμβέλειας που καλύπτουν την Περιφέρεια) είναι:

- Στην πρώτη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ υπεβλήθησαν 8 προτάσεις συνολικού προτεινόμενου Π/Υ 8.620.069,00 € € (Δ.Δ.).
- Στη δεύτερη Πρόσκληση του ΕΠ ΨΣ υπεβλήθησαν συνολικά 8 προτάσεις συνολικού προτεινόμενου Π/Υ 4.640.748,00 € € (Δ.Δ.).

Οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία του ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του άξονα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχουν εξειδικευτεί στο μεγαλύτερο ποσοστό Συγκεκριμένα έχουν εξειδικευτεί παρεμβάσεις ποσού 71.121.380 € επί συνολικής δέσμευσης του ΠΕΠ στον Ενδιάμεσο Φορέα ποσού 75.000.000 €, ποσοστό 94,8%.

Συνολικά εγκρίθηκαν εκχωρήσεις προς τον ΕΦΔ σε κατηγορίες πράξεων που εντάσσονται στους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 03, 04, 05, 09 και 33 συνολικού προϋπολογισμού 3.740.001 €.

Επίσης οι Προσκλήσεις που έχουν αποσταλεί έως 31.12 2008 σε Δικαιούχους και αφορούν σε έργα υποδομής, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι οι εξής:

- Πρόσκληση σε Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Εποπτεία της Αγοράς - Α' Φάση» (Α.Π.

13680/A2/4/12.11.2008), συνολικού π/υ 1.800.000 € (χρηματοδότηση 100%).

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 57.600 € του συνολικού π/υ της

- Πρόσκληση στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Ενέργειες για την απρόσκοπτη τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, ασφάλεια τροφοδότησης και αύξηση της ευστάθειας του συστήματος. Μετρήσεις Ενέργειας που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίσπευση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί και η αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς» (Α.Π. 15876/A2/7/18.12.2008) συνολικού π/υ 3.883.382 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 280.027 € του συνολικού π/υ της πρόσκλησης.

γ. Αναφορικά με τα έργα κρατικών ενισχύσεων έχουν προκηρυχθεί και αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι ακόλουθες πράξεις:

- «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Έντασης Γνώσης στην Μικροηλεκτρονική – Ενίσχυση φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 33.000.000 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 135.000 € της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

- «Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Vouchers for SME's» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 8.400.000 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό 30.000 € της συνολικής δημόσιας δαπάνης.

- «Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (Α.Π. 28519/3298/23.12.2008), συνολικής δημόσιας δαπάνης 100.000.000 €.

Σύμφωνα με την κατανομή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αναλογεί ποσό δημόσιας δαπάνης 2.200.000 €.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός νέων επιχειρήσεων από επιδοτούμενα προγράμματα (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	50									
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										163
	Αφετηρία	300									
Αριθμός υποστηριζόμενων επιχειρήσεων από Δομές Στήριξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1.256
	Αφετηρία	1.000									
Αριθμός επιχειρήσεων που ωφελούνται από δράσεις Έρευνας & Ανάπτυξης / Καινοτομίας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17
	Αφετηρία	0									
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (MW)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25
	Αφετηρία	0									
Αριθμός νέων τουριστικών κλινών (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										300
	Αφετηρία	240									
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
Αριθμός τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										120
	Αφετηρία	90									
Αριθμός υποδομών εγκατάστασης υποδοχής επιχειρήσεων που γίνονται παρεμβάσεις (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	3									
Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις για ενσωμάτωση ΤΠΕ στην καθημερινή τους λειτουργία (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										764
	Αφετηρία	154									
Δημιουργούμενες & Νέες Επιχειρήσεις που παράγουν ή αξιοποιούν ΤΠΕ και χρηματοδοτούνται από venture capital και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										18
	Αφετηρία	0									
Χρηματοδοτούμενοι κόμβοι παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	0									
ICT projects (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25
	Αφετηρία	0									

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Αποτελέσματα											
Ποσοστό αύξησης των επιχειρήσεων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,2
	Αφετηρία	1,5									
Ποσοστό υφιστάμενων ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1,5
	Αφετηρία	0,5									
Ποσοστό αύξησης των τουριστικών κλινών (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17
	Αφετηρία	15									
Ποσοστό τουριστικών κλινών που εκσυγχρονίζονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17
	Αφετηρία	5									
Ποσοστό εγκαταστάσεων υποδοχής επιχειρήσεων που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	30									
Νέες θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται από τις ΜΜΕ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										350
	Αφετηρία	240									
Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Παραγγελιών (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										14,62
	Αφετηρία	11,09									
Χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις με δυνατότητα αποδοχής Ηλεκτρονικών Πληρωμών για Πωλήσεις μέσω διαδικτύου (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2,19
	Αφετηρία	1,02									
Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες του Δημοσίου που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του συνόλου των επιχειρήσεων της Περιφέρειας)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										90,85
	Αφετηρία	82,17									
Επωφελοούμενοι Πολίτες από Χρηματοδοτούμενους Εξοπλισμούς ΤΠΕ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										21.257
	Αφετηρία	0									
Πολίτες που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας ΔΜ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17
	Αφετηρία	9									
Πολίτες που χρησιμοποιούν τις Δημιουργούμενες Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης που είναι Πλήρως Διαθέσιμες Ηλεκτρονικά (εκτός Δημόσιας Διοίκησης) (% επί του πληθυσμού της Περιφέρειας ΔΜ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										17
	Αφετηρία	8									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.5.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισης τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη ύπαρξης ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.6 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

3.6.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο ρόλος του Άξονα Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα» της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης είναι επικουρικός, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες της Περιφέρειας προβλέπεται να καλυφθούν κατεξοχήν μέσω των αντίστοιχων Τομεακών Προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα προβλέπονται άμεσες ενισχύσεις για την προώθηση επενδυτικών σχεδίων στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, εστιασμένες σε ειδικά χωρικά σύνολα και ιδιαίτερα σε περιοχές ή τομείς που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αναδιάρθρωση της οικονομικής τους δραστηριότητας (π.χ. αγροτικές περιοχές, μεθοριακές περιοχές,), σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και σε ειδικές μορφές τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός) σε συνάφεια με τις χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ. Επίσης, προβλέπεται να υλοποιηθούν δράσεις προστασίας του πλούσιου γεωθερμικού αποθέματος που διαθέτει η Περιφέρεια, συμβάλλοντας έτσι στην ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι προαναφερόμενες προβλεπόμενες δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται και εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα, παρουσιάζονται παρακάτω τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικείμενου του Άξονα Προτεραιότητας. , Με δεδομένη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων , συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Επιχειρήσεις που εκσυγχρονίζονται / αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										230
	Αφετηρία	710									
Αποτελέσματα											
Ποσοστό ΜΜΕ που εκσυγχρονίζονται / βελτιώνονται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25%
	Αφετηρία										

- Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.6.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.7 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

3.7.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας, ανά τομέα (θεματικά ή χωρικά) έχουν ως εξής:

- Στον τομέα του περιβάλλοντος, η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων για την αναβάθμιση προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών υποδομών και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, θα επιτευχθεί με την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, την πλήρη ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, την διαχείριση κινδύνων και την αειφορική διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
- Στον τομέα της υγείας, η ανάπτυξη των υποδομών στις τρεις βαθμίδες ιατρικής περίθαλψης, καθώς και των δομών προστασίας της Δημόσιας Υγείας.
- Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ολοκλήρωση της διαδικασίας ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης των υποδομών, ώστε να καταστεί το εκπαιδευτικό σύστημα, σε περιφερειακό επίπεδο, πρότυπο σε ότι αφορά στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας.
- Στον τομέα του τουρισμού, η ανάπτυξη των υποδομών που θα στηρίζουν τη φέρουσα τουριστική ικανότητα τόσο των ανεπτυγμένων, όσο και αυτών που είναι σε διαδικασία ανάπτυξης τουριστικών περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας.
- Η προστασία, αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των πολιτιστικών πόρων (του μνημειακού αποθέματος και των νεότερων εκφραστικών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών μέσων της πλούσιας Ελληνικής παράδοσης) και η ένταξή τους στην περιφερειακή και τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, είναι η στόχευση των παρεμβάσεων στον Τομέα του Πολιτισμού.

- Στις παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης, η ανασυγκρότηση και αειφόρος οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών κέντρων της Κεντρικής Μακεδονίας.
- Η στρατηγική ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, καθώς και των αγροτικών περιοχών επικεντρώνεται στην ενίσχυση της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων των περιοχών αυτών, στην παράλληλη προστασία και ανάδειξη του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Εντός του 2008 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας **εξειδικεύτηκαν** 579.500.000 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, στους παρακάτω κωδικούς θέματος προτεραιότητας:

- 69 «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης ης γυναίκας...» (δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ), προϋπολογισμού 20.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», προϋπολογισμού 80.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», προϋπολογισμού 52.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», προϋπολογισμού 134.500.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών», προϋπολογισμού 48.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 60 «Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών», προϋπολογισμού 10.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 75 «Υποδομές εκπαίδευσης», προϋπολογισμού 144.000.000 εκ. € Δημόσιας Δαπάνης,
- 76 «Υποδομές υγείας», προϋπολογισμού 60.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 79 «Άλλες κοινωνικές υποδομές», προϋπολογισμού 31.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης.

Εξ αυτών **εκχωρήθηκαν** 292.836.310 €, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

- «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης ης γυναίκας...» (δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ), εκχώρηση ύψους 20.011.865 € συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης και πρόσθετοι εθνικοί πόροι ύψους 1.880.935 €. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 21.892.800 €,

- 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», εκχώρηση ύψους 47.884.445 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 45 «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», εκχώρηση ύψους 31.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 58 «Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς», εκχώρηση ύψους 72.740.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 59 «Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών», εκχώρηση ύψους 28.800.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 60 «Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών», εκχώρηση ύψους 6.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 75 «Υποδομές εκπαίδευσης», εκχώρηση ύψους 86.400.000 € Δημόσιας Δαπάνης,

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προχώρησε σε δημοσίευση δύο (2) **προσκλήσεων** εκδήλωσης ενδιαφέροντος ύψους 69.777.245 €:

- «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης ης γυναίκας...» (δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ), προϋπολογισμού 21.892.800 € συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Η πρόσκληση, προς τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιεύτηκε στις 05/09/2008. Οι προτάσεις αξιολογούνταν με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης.
- 44 «Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων», προϋπολογισμού 47.884.445 € Δημόσιας Δαπάνης. Η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στις 30/12/2008 και το πρώτο τρίμηνο υποβολής προτάσεων λήγει στις 30/03/2009.

Στη συνέχεια εντάχθηκε μια (1) πράξη στον κωδικό θέματος προτεραιότητας:

- «Μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης ης γυναίκας...» (δράσεις ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ), προϋπολογισμού 21.892.800 € συνολικής Δημόσιας Δαπάνης, με ημερομηνία ένταξης 04/12/2008 και τίτλο «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας».

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	7									
Αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										378
	Αφετηρία	200,2									
Έργα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3
	Αφετηρία	6									
Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										9
	Αφετηρία	31									
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										376
	Αφετηρία	5.886									
Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										19
	Αφετηρία	15									
Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	10									
Αριθμός μνημείων / αρχαιολογικών χώρων που αναδεικνύονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30
	Αφετηρία	44									
Πλήθος τουριστικών πολιτιστικών υποδομών που υποστηρίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										4
	Αφετηρία	0									
Υποδομές πολιτισμού που δημιουργήθηκαν ή αναβαθμίστηκαν (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25
	Αφετηρία	5									
Αίθουσες διδασκαλίας που κατασκευάζονται - βελτιώνονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										538
	Αφετηρία	7.687									
Εξοπλισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										313
	Αφετηρία	50									
Μήκος γραμμών μέσων μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										9,6
	Αφετηρία	0									

Συνέχεια Πίνακα

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Αποτελέσματα											
Ποσοστό των παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων που διατίθεται σε ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										25%
	Αφετηρία	43,75%									
Εξυηρητούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100.000
	Αφετηρία	64.700									
Εξυηρητούμενος πληθυσμός από έργα προστασίας από φυσικούς κινδύνους (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1.709.148
	Αφετηρία	1.422.524									
% νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6,39%
	Αφετηρία	50,10%									
Εξυηρητούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										240.000
	Αφετηρία	160.000									
Ποσοστό περιοχών NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										11%
	Αφετηρία	0									
Ποσοστό αύξησης επισκεπτών μνημείων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										90%
	Αφετηρία	81,12%									
Σχολεία Α'Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										3%
	Αφετηρία	73%									
Σχολεία Β'Βαθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν σε μία βάρδια (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6%
	Αφετηρία	60%									
Πρόσθετος πληθυσμός με δυνατότητα πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										250.000
	Αφετηρία	0									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.7.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος φυσικού αντικειμένου κατά την περίοδο αναφοράς, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.8 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

3.8.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Οι γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 8 είναι οι εξής:

- Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων στην προώθηση της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής και του επιπέδου ζωής και διαμόρφωση ενός λειτουργικού πλέγματος επικοινωνίας με τις αγροτικές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας.
- Βελτίωση της ελκυστικότητας του ανθρωπογενούς και της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος
- Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας, ιδίως προς τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, μέσω βελτίωσης της προσπελασιμότητας και της ανάπτυξης πολυθεματικών συνεργασιών.

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε ειδικούς, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Με δεδομένο δε ότι, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, δεν εμφανίζεται φυσική πρόοδος στην εφαρμογή του άξονα, παρουσιάζονται παρακάτω τα προγραμματικά στοιχεία φυσικού αντικειμένου του Άξονα Προτεραιότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τη μη εμφάνιση φυσικής και οικονομικής προόδου, δεν είναι δυνατή η ποιοτική ανάλυση επιτευγμάτων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνεπειών στην ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ως εκ τούτου, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκρών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον παρόντα Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΔΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός Νέων ΕΕΛ	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	4									
Αριθμός ΕΕΛ που αναβαθμίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	8									
Δίκτυο ύδρευσης (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										48
	Αφετηρία	260									
Δίκτυο αποχέτευσης (Χλμ)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20
	Αφετηρία	85									
Αριθμός περιοχών NATURA 2000 με φορείς και σχέδια διαχείρισης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										1
	Αφετηρία	2									
Αίθουσες διδασκαλίας που κατασκευάζονται - βελτιώνονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										150
	Αφετηρία	120									
Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	8									
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										100
	Αφετηρία	148									
Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	5									
Αποτελέσματα											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από Νέους ΕΕΛ (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10.000
	Αφετηρία	20.000									
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										20.000
	Αφετηρία	80.000									
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										27.000
	Αφετηρία	40.000									
% νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										10
	Αφετηρία	16									
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8.000
	Αφετηρία	125.000									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.8.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.9 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

3.9.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Ο συγκεκριμένος Άξονας Προτεραιότητας συμβάλει στην αυτοτροφοδοτούμενη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, στοχεύοντας στην προστασία, αναβάθμιση και ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, στην εξασφάλιση της υγείας του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας, στην αναβάθμιση των συνθηκών ποιότητας του εκπαιδευτικού δικτύου, στην ανάδειξη του πολιτισμού ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και στην επίτευξη χωρικής συνοχής της Περιφέρειας.

Εντός του 2008, εξειδικεύθηκαν οι Κωδικοί Θεματικής Προτεραιότητας 45 «Διαχείριση και Διανομή Ύδατος» (48.000.000 €) και 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης (30.000.000 €). Επιπλέον, εξειδικεύθηκε ο Κωδικός Θεματικής Προτεραιότητας 69 «Μέτρα για την Βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας και να εναρμονιστεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή όπως οι διευκολύνσεις παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και φροντίδας εξαρτημένων προσώπων», δημόσιας δαπάνης 10.000.000 €.

Οι στόχοι αυτοί του Άξονα Προτεραιότητας εξειδικεύονται σε επιμέρους ειδικούς, οι οποίοι σε σημαντικό βαθμό εκφράζονται στους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που αφορούν στον Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δείκτες		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Σύνολο
Εκροές											
Αριθμός Νέων ΕΕΛ	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	19									
Αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										200
	Αφετηρία	300									
Αριθμός ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που δημιουργούνται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										2
	Αφετηρία	3									
Αριθμός υφιστάμενων ΧΑΔΑ	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										0
	Αφετηρία	35									
Υποδομές Μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										5
	Αφετηρία	14									
Αριθμός νοσοκομειακών κλινών που δημιουργούνται / αναβαθμίζονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										434
	Αφετηρία	1.868									
Αριθμός σχεδίων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										6
	Αφετηρία	6									
Υποδομές μονάδων κοινωνικής φροντίδας (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										15
	Αφετηρία	130									
Αριθμός μνημείων / αρχαιολογικών χώρων που αναδεικνύονται	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										8
	Αφετηρία	17									
Υποδομές πολιτισμού που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										9
	Αφετηρία	11									
Κατασκευή / αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΕΙ - ΤΕΙ (τ.μ.)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										30.000
	Αφετηρία	22.540									
Αποτελέσματα											
Πληθυσμός που εξυπηρετείται από ΕΕΛ (Ισοδύναμος πληθυσμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										320.000
	Αφετηρία	300.000									
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από αναβαθμισμένα δίκτυα ύδρευσης (Ισοδύναμος πληθυσμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										490.000
	Αφετηρία	420.000									
% νοσοκομειακών κλινών που αναβαθμίζονται / δημιουργούνται (%)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										23%
	Αφετηρία	39%									
Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από παρεμβάσεις ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης (Αριθμός)	Ολοκλήρωση										
	Στόχος										60.000
	Αφετηρία	50.000									

• Όσον αφορά στις τιμές αφετηρίας, οι πηγές άντλησης των στοιχείων και οι σχετικές επεξηγήσεις παρουσιάζονται στο Ε.Π.

3.9.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.10 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας»

3.10.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, που ανήκουν στο στόχο σύγκλισης – phasing out, εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Εντός του 2008 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας **εξειδικεύθηκαν και εκχωρήθηκαν** 6.854.000 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, στους παρακάτω κωδικούς θέματος προτεραιότητας:

- 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση», προϋπολογισμού 2.954.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία», προϋπολογισμού 3.900.000 € Δημόσιας Δαπάνης.

Αντίστοιχα, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας **εξειδικεύθηκαν και εκχωρήθηκαν** 4.000.000 € σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, στους παρακάτω κωδικούς θέματος προτεραιότητας:

- 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση», προϋπολογισμού 2.500.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία», προϋπολογισμού 1.500.000 € Δημόσιας Δαπάνης.

Στις 16/12/2008 εκδόθηκε η τρίτη Πρόσκληση από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Ψηφιακής Σύγκλισης ΕΠ ΨΣ, η οποία αφορά στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ». Ο

προϋπολογισμός της είναι 23,89 Μ€ (ΔΔ), τα οποία αφορούν στο σύνολο των 13 Περιφερειών της Ελλάδας.

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η παραπάνω πρόσκληση αφορούσε σε ποσό 1.392.827 ευρώ για τον κωδικό 85 και 1.054.397 ευρώ για τον κωδικό 86.

Αντίστοιχα, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η παραπάνω πρόσκληση αφορούσε σε ποσό 386.197 ευρώ για τον κωδικό 85 και 144.825 ευρώ για τον κωδικό 86.

3.10.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, επειδή δεν υπήρξε ένταξη πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

3.11 Υλοποίηση στον Άξονα Προτεραιότητας 10.2 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης»

3.11.1 Επίτευξη στόχων και ανάλυση της προόδου

Αντίστοιχα, προς τον προηγούμενο Άξονα Προτεραιότητας, η Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, που αποτελεί περιφέρεια αμιγούς στόχου «σύγκλισης», εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων, την παροχή οδηγιών και υποστήριξης προς τους εμπλεκόμενους φορείς (δημόσιους, ιδιωτικούς), την υποστήριξη και υποβοήθηση όλων των διοικητικών δομών και μηχανισμών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Εντός του 2008 στον συγκεκριμένο Άξονα Προτεραιότητας και για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης **εξειδικεύθηκαν και εκχωρήθηκαν 3.000.000 €** σε όρους Δημόσιας Δαπάνης, στους παρακάτω κωδικούς θέματος προτεραιότητας:

- 85 «Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση», προϋπολογισμού 1.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης,
- 86 «Αξιολόγηση και μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία», προϋπολογισμού 2.000.000 € Δημόσιας Δαπάνης.

3.11.2 Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους

Κατ' αντιστοιχία με τα προαναφερόμενα, λόγω της μη ύπαρξης ένταξης πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας, δεν μπορεί να γίνει λόγος για εμφάνιση προβλημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΛΟΙΠΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.1 Έργα - Γέφυρες

Ως έργα-γέφυρες χαρακτηρίζονται έργα των οποίων μέρος του φυσικού αντικειμένου συγχρηματοδοτείται από ΕΠ της περιόδου 2000-2006 και μέρος από ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.

Σε κάθε ΕΠ του ΕΣΠΑ προσδιορίζονται τα μεγάλα έργα γέφυρες (κατά την έννοια του άρθρου 39 του Καν. (ΕΚ) 1083/2006) που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από αυτό. Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα έργα-γέφυρες για το Π.Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013:

ΤΙΤΛΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (Δ.Δ.)
ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ «ΑΡΔΑΝΙΟ – ΟΡΜΕΝΙΟ» ΤΜΗΜΑ : «ΜΑΝΔΡΑ – ΨΑΘΑΔΕΣ»	50.919.265
	ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.196.000.000
	ΣΥΝΟΛΟ	1.246.919.265
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ	2

4.2 Ενσωμάτωση της Αρχής της Μη Διάκρισης και των κριτηρίων προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία (Άρθρο 16/1083/2006)

Με δεδομένο το στάδιο εφαρμογής του Προγράμματος κατά το έτος 2008, το οποίο, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, ήταν έτος κυρίως ολοκλήρωσης της προετοιμασίας εφαρμογής του Προγράμματος, καθώς και σχεδιασμού και προετοιμασίας των μηχανισμών παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου δεν υφίστανται απολογιστικά στοιχεία παρακολούθησης της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί για την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π..

Παρ' όλα αυτά, τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την προετοιμασία εφαρμογής λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής της θρησκείας ή

των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά τα διάφορα στάδια υλοποίησης των δράσεων των Ταμείων και ειδικότερα της πρόσβασης σε αυτά. Ειδικότερα, η δυνατότητα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελεί ένα από τα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης.

Τα μέτρα που προβλέπονται για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και την αποτροπή διακρίσεων στα διάφορα στάδια υλοποίησης του Ε.Π. περιλαμβάνουν:

- (i) Την ισόρροπη κατά το δυνατόν συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠ και την εκπροσώπηση σε αυτή κρατικών αρχών, που είναι αρμόδιες για θέματα ισότητας, καθώς και κοινωνικών οργανώσεων ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.
- (ii) Τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική συγχρηματοδότηση.
- (iii) Την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που έχουν ληφθεί σε σχέση με την παροχή ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο του Ε.Π., την αποτελεσματικότητα τους και τις διορθωτικές παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης.
- (iv) Τη χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες κατά την διαδικασία επιλογής πράξεων για συγχρηματοδότηση.

Με την διεξαγωγή της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης που έλαβε χώρα στις 20.02.2008 στην Καστοριά εγκρίθηκαν μεταξύ άλλων και δύο σχετικά κριτήρια επιλογής πράξεων το Β3 «Προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκριση» και Β4 «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία».

Συγκεκριμένα:

1. Στο υποκριτήριο Β3: «Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση», εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της πράξης εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της μη διάκρισης εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της ύπαρξης

αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού. Συγκεκριμένα εξετάζεται αν έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες μέχρι την χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Στο υποκριτήριο Β4: «Τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία», εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ όπου εφαρμόζεται λαμβάνοντας υπόψη τις ΟΜΟΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγκεκριμένα εξετάζεται αν έχουν τηρηθεί οι αντίστοιχοι κανόνες μέχρι την χρονική στιγμή της αίτησης χρηματοδότησης, εφόσον ανταποκρίνονται στο φυσικό αντικείμενο της πράξης.

Στις κατηγορίες παρεμβάσεων που έχουν συμπεριληφθεί στους επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΠ «ΨΣ», γίνεται σειρά αναφορών για ειδικές δράσεις που αφορούν στα ΑμεΑ δίνοντας έμφαση στην «ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ΑμεΑ και της αρχής της μη διάκρισης».

Τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης (15/3/2008) κατατάσσονται σε δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλονται ενώ η δεύτερη ενότητα κριτηρίων περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες (σαφήνεια πρότασης, τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, σκοπιμότητα και ωριμότητα της πράξης). Στη δεύτερη κατηγορία ελέγχεται η τήρηση των κανόνων για την εξασφάλιση προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Συγκεκριμένα, εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η δράση ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες τις κατηγορίες ΑμεΑ σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα, ως προς τις υπηρεσίες και την πληροφόρηση με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο των δυο πρώτων Προκλήσεων το κριτήριο αυτό εξειδικεύεται με την υιοθέτηση της αρχής του «Σχεδιάζοντας για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας σε ΤΠΕ για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες τις οδηγίες προσβασιμότητας W3C και συγκεκριμένα στα Web Content Accessibility Guidelines (WAI/WCAG).

4.3 Τεχνική Βοήθεια

Κατά το έτος 2008, δεν πραγματοποιήθηκε ένταξη πράξεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο των σχετικών Αξόνων Προτεραιότητας 10.1 «Τεχνική Υποστήριξη

Εφαρμογής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» και 10.2: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης», παρά μόνο εξειδίκευση μέρους του προϋπολογισμού των ανωτέρω αξόνων.

4.4 Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Τον Ιούλιο του 2008 καταρτίστηκε το Επικοινωνιακό Σχέδιο του ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, όπου καθορίζονται λεπτομερώς τα απαραίτητα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας για την επικοινωνία του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η Κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου προβλέπεται από τον Εφαρμοστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της 8^{ης} Δεκεμβρίου 2006. Για την κατάρτιση του Επικοινωνιακού Σχεδίου έχουν ληφθεί υπόψη:

- Ο (ΕΚ)1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999.
- Ο (ΕΚ) 1828/2006 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των διατάξεων των (ΕΚ)1083/2006 και (ΕΚ) 1080/2006 και ειδικότερα τις διατάξεις που ορίζουν τις γενικές κατευθύνσεις για την εκπόνηση, τη διαδικασία εξέτασης και την εφαρμογή και παρακολούθηση του Επικοινωνιακού Σχεδίου.
- Ο Ν.3614/2007, Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
- Η Απόφαση 5337 – Ε(2007) με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας –Θράκης □ Η αποκτηθείσα εμπειρία από τα προγράμματα Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή του Γ΄ ΚΠΣ.

Η στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης αποτελεί το μέσο που υποδεικνύει :

- Τον τρόπο με τον οποίο η στοχοθεσία των έργων και των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠ συμβάλλει στους γενικούς στόχους του ΕΠ
- Τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα και οι ωφέλειες από την ολοκλήρωση των έργων και των δράσεων του ΕΠ συμβάλλουν στην εκπλήρωση του οράματος για τη χωρική ενότητα και στην ικανοποίηση των συνιστωσών του.

Το επικοινωνιακό σχέδιο του ΕΠ Μακεδονίας-Θράκης εγκρίθηκε στις 11/09/2008 με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι τις 31/12/2008, οι ενέργειες δημοσιότητας και πληροφόρησης που είτε αναλήφθηκαν απευθείας από την ΕΔΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είτε πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με αυτήν, ήταν – με χρονολογική σειρά – οι παρακάτω :

1. Εναρκτήρια εκδήλωση του ΥΠΟΙΟ στο Roadshow για το ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Επιτρόπου Danuta Hubner (Μουσείο Τεχνολογίας, 22/02/2008). Η ΕΔΑ ΠΚΜ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση του επικοινωνιακού υλικού που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενώ η εισήγηση Γενικού Γραμματέα καθ. Γεωργίου Τσιότρα επικεντρώθηκε στο ΕΠ Μακεδονία-Θράκη, το όραμα και τις παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
2. Roadshow της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στους 7 νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, από τα τέλη Φεβρουαρίου 2008, ο Γενικός Γραμματέας, η διεύθυνση και τα στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ξεκίνησαν πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων στις πρωτεύουσες των επτά νομών της Περιφέρειας, προκειμένου οι φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων και έργων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα προγραμματική περίοδος, για τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και τις διαδικασίες υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης, ένταξης και υλοποίησης, με στόχο την ορθή και έγκαιρη προετοιμασία των δυνητικών δικαιούχων για την παραγωγή ώριμων και ποιοτικών έργων.

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διήρκεσαν περίπου 2 μήνες, ενώ το πρόγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής: Βέροια στις 28/02/2008, Κατερίνη στις 4/03/2008, Πολύγυρος στις 12/03/2008, Κιλκίς στις 18/03/2008, Έδεσσα στις 30/03/2008, Θεσσαλονίκη στις 7/04/2008, και Σέρρες στις 22/04/2008.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν βουλευτές, Νομάρχες και πρόεδροι των ΤΕΔΚ κάθε Νομού, δήμαρχοι, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, νομαρχιακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και αναπτυξιακών εταιρειών, στελέχη και διευθυντές υπηρεσιών, εκπρόσωποι παραγωγικών και επιστημονικών φορέων.

3. Παραγωγή ενημερωτικού / προωθητικού έντυπου υλικού για τις παρεμβάσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4. Παραγωγή 2 banners / λαβάρων για τη σηματοδότηση εκδηλώσεων που σχετίζονται με το ΕΠ Μακεδονία-Θράκη
5. Συνδιοργάνωση με τη ΜΟΔ εκδήλωσης προς τους δυνητικούς δικαιούχους του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τίτλο «Εθνικό και

κοινοτικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων – Δημόσια Έργα» (Θεσσαλονίκη, Mediterranean Palace, 16-17/10/2008)

6. Ενημέρωση για την πορεία εκπόνησης, υποβολής, έγκρισης και έναρξης υλοποίησης του ΕΠ Μακεδονία-Θράκη στο τεύχος Newsletter της ΕΔΑ ΠΚΜ, από το 2007 έως και τον Ιούνιο 2008
7. Δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων στο www.espa.gr και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΔΑ ΠΚΜ, όλου του συνοδευτικού υλικού, καθώς και πλήθος ενημερωτικού υλικού που αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις διαδικασίες και το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου, κλπ, στο πλαίσιο εξασφάλισης της διαφάνειας σχετικά με την πρόσβαση στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ
8. Ενημέρωση και δημιουργία προωθητικού υλικού σχετικά με το ΕΣΠΑ με την ευκαιρία της συμμετοχής της ΕΔΑ ΠΚΜ στην 73η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο 2008.

Στο πλαίσιο συμπληρωματικών παρεμβάσεων δημοσιότητας από την πλευρά της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν πραγματοποιηθεί οι κάτωθι Δράσεις:

1. Διαμόρφωση λογοτύπου Υπηρεσίας στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου.
2. Συμμετοχή της ΕΔΑ ΑΜΘ, με δικό της περίπτερο, στην έκθεση «ΘΡΑΚΗ» προβάλλοντας το ΕΣΠΑ 2007-2013, με ηλεκτρονικά μέσα, διανέμοντας παράλληλα έντυπο ενημερωτικό υλικό.
3. Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για το ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
4. Ενημέρωση της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας (www.eydamth.gr) - με συχνότητα δύο φορές την εβδομάδα - και εμπλουτισμός τους με νέα στοιχεία.
5. Ενημέρωση του ιστοχώρου του ΕΣΠΑ www.espa.gr (δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων κλπ.)
6. Ημερίδες στην έδρα των 5 Νομών της Περιφέρειας με θέμα την ολοκλήρωση της τρέχουσας και την έναρξη της επόμενης Προγραμματικής περιόδου (12/6-1/7/2008).
7. Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος.
 - Ημερίδα στην Κομοτηνή για τις διαδικασίες επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας των φορέων (4/6/2008).
 - Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους με τη διοργάνωση σεμιναρίων στην έδρα των 5 Νομών, όπου παρουσιάστηκαν και

δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση των Εντύπων της Δ' Προγραμματικής Περιόδου (22/10 – 14/11/2008)

- Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στελεχών ΕΔΑ ΑΜΘ στις διαδικασίες της νέας προγραμματικής περιόδου (15-16/11/2008)

Επιπλέον το 2008 συνεχίστηκε τα πρόγραμμα προβολής και ενημέρωσης για τις δράσεις ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΕ

Οι σημαντικότερες ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά το 2008 είναι οι εξής:

- Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης. Από τις αρχές του χρόνου απαντήθηκαν 2.579 κλήσεις που αφορούσαν στο ΕΠΑΝ ΙΙ. Εστάλησαν 73 ηλεκτρονικές απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού και επισκέφθηκαν το γραφείο 242 ενδιαφερόμενοι.
- Ολοκλήρωση σχεδιασμού του ιστοχώρου του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Περιλαμβάνει αυτόματο σύστημα ειδοποίησης με το οποίο όλοι οι εγγεγραμμένοι σε αυτό λαμβάνουν ειδοποίηση για κάθε νέο που εισάγεται στην ενότητα που έχουν επιλέξει κατά την εγγραφή τους Έχουν ήδη εγγραφεί 2.900 χρήστες, ενώ κατά τους μήνες λειτουργίας του, κατά μέσο όρο ο ιστοχώρος δέχεται περισσότερους από 1200 επισκέπτες τη μέρα.
- Συνεχής επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.info3kps.gr του ΥΠΟΙΟ με αποστολή στη ΜΟΔ των στοιχείων των ανοικτών προκηρύξεων.
- Τον Μάρτιο του 2008 το ΕΠΑΝ ξεκίνησε μια διαδρομή στις 13 περιφέρειες της χώρας, ενημερώνοντας για το περιεχόμενο των παρεμβάσεων του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και επιδιώκοντας την δημιουργία μιας γέφυρας διαλόγου για την ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων αναφορικά με την εξειδίκευση του ΕΠΑΝ ΙΙ και τις δράσεις του για την Ελληνική Περιφέρεια. Το ταξίδι ενημέρωσης ολοκληρώθηκε στην Αθήνα με την εναρκτήρια εκδήλωση υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ η οποία για συμβολικούς λόγους έγινε στις 8 Μαΐου που είναι η μέρα της Ευρώπης.
- Από την αρχή του χρόνου η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε σε Ημερίδες, Συνέδρια και Fora με σκοπό την προβολή και την προώθηση του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), στην Αθήνα και την Περιφέρεια:
 - ⇒ Ημερίδα ΟΕΣΥΝΕ (ΕΒΕΑ - Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών) στην Αθήνα, Φεβρουάριος 2008

- ⇒ 3^ο Συνέδριο ΙΑΓΜΕ (Ινστιτούτο Ανάπτυξης Γυναίκων Μάνατζερ & Επιχειρηματιών) στον Ναυτικό Όμιλο Πειραιά, Μάρτιος 2008
- ⇒ 9^ο Διεθνές Venture Capital Forum στο ξενοδοχείο Hilton, Ιούνιος 2008
- ⇒ 1^ο Forum Επιχειρηματικότητας στο Χαλάνδρι, Σεπτέμβριος 2008
- Τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ υπήρξε περαιτέρω προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), συνδυάζοντας την προβολή των ευκαιριών που προσφέρει το Πρόγραμμα με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και των Καλών Πρακτικών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ), χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα προώθησης - video, cd, έντυπα, προφορική ενημέρωση, κλπ.
- Η ΕΥΔ ΕΠΑΝ συμμετείχε με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στις ακόλουθες εκθέσεις στο κέντρο και την Περιφέρεια:
 - ⇒ Έκθεση Climatherm στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, Φεβρουάριος 2008
 - ⇒ EnergyRes στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, Απρίλιος 2008
 - ⇒ 13^ο Τουριστικό Πανόραμα στην Αθήνα, Απρίλιος 2008
 - ⇒ Αγροτικός Αύγουστος στα Χανιά, Αύγουστος 2008
 - ⇒ Πανελλήνια Γενική Έκθεση «7ο Επιχειρηματικό Πανόραμα», Βόλος Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2008
 - ⇒ Πανελλήνια Γενική Έκθεση «ΚΡΗΤΗ 2008» στο Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008
 - ⇒ 8^η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας, Οκτώβριος 2008
 - ⇒ Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας 2008, Οκτώβριος – Νοέμβριος 2008
 - ⇒ 1^η Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας Νέων στην Τεχνόπολις στο Γκάζι, Νοέμβριος 2008
- Μέσω της προβολής video, διανομής ενημερωτικού και προωθητικού υλικού, διαγωνισμών και της ζωντανής επικοινωνίας με το ευρύ κοινό, προωθήθηκε η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ, η προσέγγιση των κοινών του Προγράμματος και η εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου κοινού από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΠΑΝ ΙΙ.
- Η ΕΥΔ ΕΠΑΕ συμμετείχε επίσης σε εκδηλώσεις ενημέρωσης στην περιφέρεια και το κέντρο σε συνεργασία με τους ΕΦΔ, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ευρωπαϊκά κέντρα και άλλους φορείς πληροφόρησης
- Στο πλαίσιο της εβδομάδας των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Open Days 2008» στις Βρυξέλλες η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του ΥΠ.ΑΝ. και το Corallia Clusters Initiative, σε στενή συνεργασία με το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομίας και το διεθνούς φήμης ερευνητικό Ίδρυμα Sophia-Antipolis οργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία ειδική εκδήλωση με θέμα «Συνεργατικοί Σχηματισμοί, εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη στη

Μεσόγειο (Clusters: a tool for Regional Development in the greater Mediterranean Region)» ενώ παράλληλα η ΕΥΔ οργάνωσε τη συμμετοχή και παρουσία της υπηρεσίας για την προβολή του προγράμματος στο investors café.

- Τον Απρίλιο 2008 έγινε μαζική αποστολή σε όλους τους Βουλευτές με το πλήρες τεύχος του Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ).
- Τον Μαΐο με αφορμή την Ημέρα της Ευρώπης μεταφράστηκε το ενημερωτικό έντυπο του ΕΠΑΝ ΙΙ, εκτυπώθηκε και εστάλη στην Φιλανδία – Ελσίνκι με σκοπό την συμμετοχή του ΕΠΑΝ ΙΙ στον εκεί εορτασμό.
- Σχεδιάστηκε και εκτυπώθηκε στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενημερωτικό έντυπο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΠΑΝ ΙΙ, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, των φορέων – πολλαπλασιαστών πληροφόρησης του προγράμματος, των Τελικών Δικαιούχων, και άλλων Διαχειριστικών Αρχών, για το νέο πρόγραμμα.
- Εκδόθηκαν 3 Ενημερωτικά Έντυπα (Newsletters) με πληροφόρηση για το ΕΠΑΝ ΙΙ και απεστάλησαν με μαζικές και μεμονωμένες αποστολές σε φορείς – πολλαπλασιαστές πληροφόρησης του προγράμματος και Τελικούς Δικαιούχους.
- Λειτουργήσε το γραφείο Τύπου του ΕΠΑΝ ΙΙ, με αποτέλεσμα την παρουσία του ΕΠΑΝ ΙΙ στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, με άρθρα και συνεντεύξεις.
- Διεξάγεται επίσης καθημερινή αποδελτίωση Τύπου καθώς και αξιολόγηση των δημοσιευμάτων.
- Υπήρξε συνεργασία με την Αρχή Συντονισμού, την Ε.Ε. και Υπηρεσίες Διαχείρισης άλλων Ε.Π. για θέματα Πληροφόρησης – Δημοσιότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Final version of 18/05/2009

COCOF 09/0008/02-EN

Annex I.

Specify Objective (required only in the case of Multi Obj programmes)	Code - Dimension 1 - Priority Theme	Code - Dimension 2 - Form of Finance	Code - Dimension 3 - Territory	Code - Dimension 4 - Economic Activity	Code - Dimension 5 - Location	EU contribution in € - allocated to selected operations
CON	05	02	00	15	GR12	12.639.000 €
CON	05	02	00	15	GR13	3.479.400 €
CON	69	01	00	20	GR12	16.600.000 €
